


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

7º Aditivo ao Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa **F. DOIS ENGENHARIA LTDA** para a Execução da obra/serviço de **CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS PARA ESTUDO INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN - EMUFRN.**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **F. DOIS ENGENHARIA LTDA** com sede na Rua Dr. Múcio Galvão, 426, sala 01- Barro Vermelho – Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 04.751.986/0001-92, neste ato representada por seu sócio Senhor **FABIANO ANDRÉ DA SILVA VERAS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n.º 025.999.924-23, RG n.º 001.357.262 – SSP/RN, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Termo Aditivo ao Contrato, **Processo Administrativo nº 23077.044281/2019-32** com fundamento na Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 - Presente Termo Aditivo tem como objeto **prorrogar o prazo de vigência do Contrato 029/2018-UFRN** e dar continuidade à execução, pela **CONTRATADA**, da **CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS PARA ESTUDO INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN - EMUFRN**, de acordo com o Projeto Básico e demais anexos do **RDC ELETRÔNICO Nº 009/2017-DMP**.

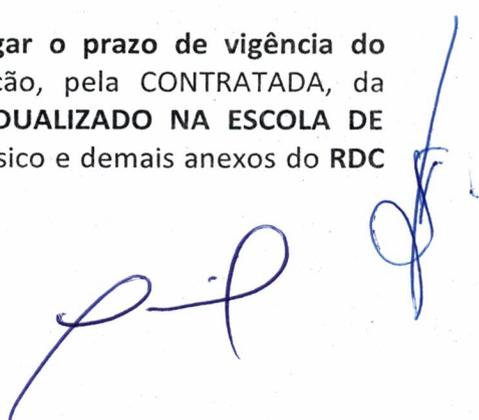

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Vigência e do Prazo de Execução

2.1 - O presente Termo Aditivo terá início a partir da data de assinatura vigorando pelo prazo de **90 (noventa dias corridos)**, com o término da execução da obra em **14 de outubro de 2019**, ficando o Término da vigência do Contrato para o dia 12 de janeiro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Ratificação

3.1- Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pela presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 16 de julho de 2019.



CONTRATANTE José Daniel Diniz Melo
Reitor

CONTRATADA
F. DOIS ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:



CPF: ID: Ioadete Raulino da Costa
Diretoria de Gestão e
Fiscalização de Contratos
Matrícula: 1459231

CPF: ID:


Lúcio Cleber Barbalho de França
Assistente em Administração
Mat. 2063330



| OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS PARA ESTUDO INDIVIDUALIZADO NA ESCOLA DE MÚSICA | | CONTRATO Nº 29/2018 | | | | | | | | | | RDC ELETRONICO 09/2017 | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| LOCAL: CAMPUS NATAL / RN | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | VALOR DO ITEM | DIAS | | | | | | | TOTAL ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO | | | |
| | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | | | 240 dias | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31.509,32 | 29.427,77 93,36% | | | | | | | | | 2.081,55 6,64% | 31.509,32 | 100,00% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 6.005,56 | 6.005,56 100,00% | | | | | | | | | | 6.005,56 | 100,00% |
| 3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | 20.803,95 | 20.803,95 100,00% | | | | | | | | | | 20.803,95 | 100,00% |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 73.299,30 | | 53.340,34 72,77% | 19.837,19 26,99% | | | 321,77 0,44% | | | | | 73.299,30 | 100,00% |
| 5 | ALVENARIA / DIVISÓRIAS | 23.786,09 | | | 11.379,18 47,84% | 8.333,56 35,04% | 4.073,35 17,12% | | | | | | 23.786,09 | 100,00% |
| 6 | ESQUADRIAS | 154.276,23 | | | | | 77.138,12 50,00% | 77.138,12 50,00% | | | | | 154.276,23 | 100,00% |
| 7 | COBERTURA | 10.102,72 | | | 10.102,72 100,00% | | | | | | | | 10.102,72 | 100,00% |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40.856,92 | | | | | | 31.500,00 77,09% | 9.356,92 22,91% | | | | 40.856,92 | 100,00% |
| 9 | DRENAGEM | 5.266,16 | | | 4.325,65 82,14% | | | 940,51 17,86% | | | | | 5.266,16 | 100,00% |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.266,22 | | 1.553,78 29,49% | | 3.714,43 70,51% | | | | | | | 5.266,22 | 100,00% |
| 11 | REVESTIMENTOS | 66.146,19 | | | 7.115,02 10,76% | 16.487,50 24,93% | | | | 21.271,84 32,16% | 21.271,84 32,16% | | 66.146,19 | 100,00% |
| 12 | VIDROS | 2.747,23 | | | | | | | | 2.747,23 100,00% | | | 2.747,23 | 100,00% |
| 13 | PINTURA | 11.210,02 | | | | | 5.605,01 50,00% | 5.605,01 50,00% | | | | | 11.210,02 | 100,00% |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 465,36 | | | | | | | | | | 465,36 100,00% | 465,36 | 100,00% |
| 15 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 37.998,03 | 4.228,05 11,13% | 3.752,22 9,87% | 3.752,22 9,87% | 2.251,33 5,92% | 7.009,21 18,44% | 10.680,28 28,11% | 2.506,44 6,60% | 3.819,28 10,05% | 37.998,03 | | 37.998,03 | 100,00% |
| 16 | FORRO | 22.766,98 | | | | | 13.250,00 58,25% | 9.516,98 41,75% | | | | | 22.766,98 | 100,00% |
| 17 | AR CONDICIONADO | 2.533,20 | | | | | 2.533,20 100,00% | | | | | | 2.533,20 | 100,00% |
| 18 | PISO | 41.244,99 | | | 1.832,10 4,44% | 4.438,82 10,76% | | 31.659,00 76,76% | 3.316,07 8,04% | | | | 41.244,99 | 100,00% |
| TOTAL SIMPLES | | 556.288,47 | 60.465,33 10,87% | 58.646,34 10,54% | 59.144,08 10,45% | 35.225,84 6,33% | 109.629,86 19,70% | 167.036,90 30,03% | 39.200,49 7,05% | 27.638,03 4,97% | | | | |
| % TOTAL ACUMULADO | | | 10,87% | 21,41% | 31,86% | 38,20% | 57,90% | 87,96% | 95,03% | 100,00% | | | | |

FDOIS ENGENHARIA LTDA

Fabiano André da Silva Veras
 Engenheiro Civil - CREA 2301469308
 CPP 025.999.194-23
